

アプローチ・コアリング 2/5～

アプローチの排水改善、土壌固結・浸水性の改善

グリーンセアによるコアリング



コア取り作業





施肥散布



目砂



擦り込み

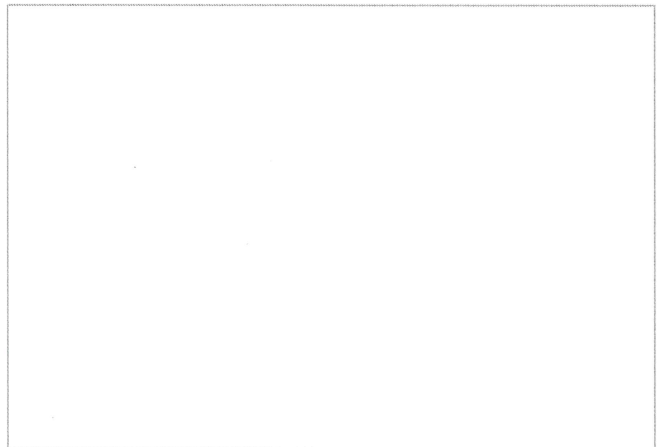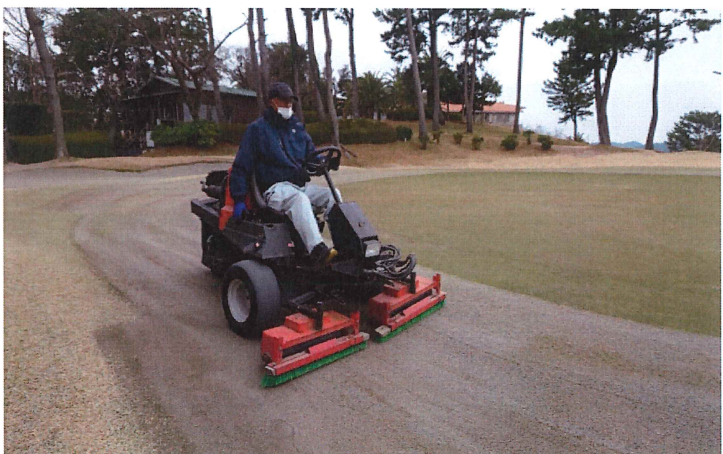

池清掃作業 2/7～

景観を良くするために、池の水草・藻・ヘドロの撤去



No.11TEE前池作業前



No.11TEE前池作業後



バックホーにて水草・ヘドロ回収

FW.RWグランドブレイカー 2/10～

100mm前後の深さで切り込みを入れ土壌の固結・排水の改善を促し、病原菌・雑草の発生を抑制する



グランドブレイカー作業
傾斜に沿って切れ込みを入れる



作業前(左) 作業後(右)



グランドブレイカー
